

Проект: AI-агент для сбора, структурирования и анализа ежедневных наблюдений за детьми с ОВЗ с визуализацией динамики и формированием прозрачных AI-подсказок для команды сопровождения.

1. Тестовое задание

Задача:

1) Составьте список из 7–10 ключевых вопросов к заказчику и стейкхолдерам (тьюторы, специалисты сопровождения, родители, врачи, тех. команда), которые вы зададите в первую очередь. Для каждого вопроса укажите: кому, зачем, какой риск закрываем.

Для подготовки вопросов первоначально необходимо ознакомиться с материалами, которые предоставит Заказчик. Но в любом случае первые встречи будут посвящены вопросам погружения в предметную область, чтобы понять, как строится процесс сейчас со стороны каждого участника, какие инструменты используют, в каком формате формируются исходные данные (файлы, аудиозаписи, рукописные заметки и т.д.), во сколько этапов и т.д. Как эти данные обрабатываются, кем, в какой последовательности. Это позволит определить текущие операции, их частоту, длительность и взаимосвязь, а также сравнить со сценариями, которые были предоставлены, т.к. утвержденные регламенты не всегда отражают действительность.

Запронуть тему грядущих изменений, в каком формате им удобнее было бы заносить в систему результаты своих работ (с телефона и ПК на основе стандартизированных форм с выбором готовых формулировок или произвольным вводом заметок, аудио-формат, фотографии рукописных заметок), после занятий или периодически во время занятий и т.д.

Далее с руководителем и юридическим блоком необходимо закрыть все вопросы безопасной работы с информацией (чтение, изменение, добавление, обезличивание и удаление), разграничении доступа к персональным данным сотрудников, детей, родителей и типам данных. Как построена текущая работа с ПДн согласно 152ФЗ и как она будет работать после внедрения обработки данных в электронном виде с доступом к информации через сеть Интернет, чтобы учесть эти моменты при разработке политик безопасности работы агента, хранения и обработки данных.

Необходимо будет также проработать вопросы о применяемых методиках, шкалах, инструментах, формах, чек-листах и формулировок, которые используют специалисты в своей работе для разработки правил формирования и интерпретации AI- подсказок. Как данные взаимосвязаны между собой, нужны ли в карточке заметки как для себя, так и для других участников с рекомендациями / напоминаниями, которые нужно учесть, применить, опробовать на следующих занятиях, позволяя использовать создаваемую систему как полноценный инструмент взаимодействия без использования сторонних инструментов общения.


Задал бы вопросы по скорости анализа вносимых данных: один раз в день, после каждого внесения, возможность ручного запуска и т.д., т.к. от этого будет зависеть стоимость использования модели и вычислительных ресурсов.

По мере погружения в предметную область список вопросов как расширялся бы, так и уменьшался, в зависимости от ответов.

2) Опишите 1 любой ключевой бизнес-процесс в любом удобном формате (текст + схема, BPMN, user flow)

Примеры:

- «Внесение и структурирование ежедневных наблюдений тьютором»

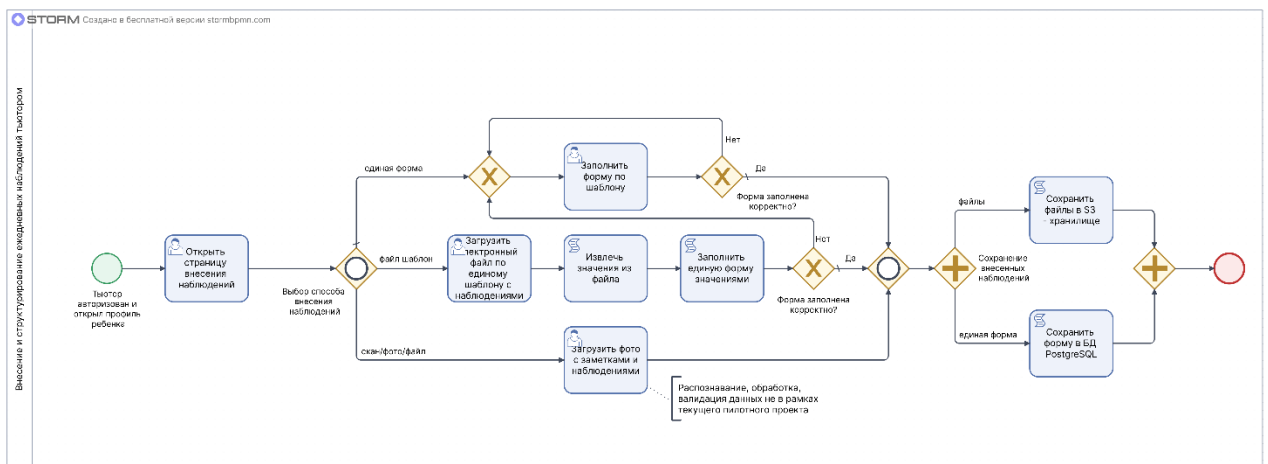

- «Сохранение наблюдений в БД и привязка к профилю ребёнка»

3) Предложите дорожную карту пилота (2 месяца):

- Основные вехи (макс. 5–7)

1 неделя

Разворачивание и настройка инструментов для командной работы и разработки. Анализ требований, встречи со стейкхолдерами, получение примеров документов, аналитика, формирование требований.

Презентация и защита концепции будущего продукта с описанием функционала и основных бизнес-процессов.

2-3 неделя

Разработка основных интерфейсов и форм ввода, личного кабинета, правил обработки и нормализации данных, внесение исторических данных, построение графиков.

4-5 неделя

AI-модуль и подготовка промптов. Ролевой доступ. Доступ Заказчика к промежуточному использованию для ввода данных и получения обратной связи. Промежуточное демо.

6-7 неделя

Доработка функционала. Приемо-сдаточные испытания. Исправление багов. Подготовка документации.

8 неделя

Демо. Сбор метрик и формирование итогового отчета. Передача проекта Заказчику.

- Критерии готовности к каждому этапу

1 неделя

Предоставлены примеры файлов с отчетами и записями от тьютора, родителя, специалистов, врача, набор итоговых выводы на основе представленных данных (по эмоциональному состоянию, коммуникациям, поведению, приему пищи, сенсорным реакциям, качеству сна и условий среды), набор справочных описаний всех состояний, чек листы для заполнения каждым специалистом и т.д.

Разработаны требования, роли, права доступа. Согласованы правила по работе с персональными данными.

Инфраструктура развернута, доступы имеют все члены команды.

2-3 неделя

Доработанные функциональные и не функциональные требования к разрабатываемой системе, US и UC, описаны основные бизнес-процессы, основные сущности и атрибуты, правила интеграции компонентов системы между собой.

Формы ввода и базовые интерфейсы, личный кабинет, доступны и работают. В базу данных загружены исторические данные. Графики формируются.

4-5 неделя

Специалисты Заказчика вносят данные в систему самостоятельно. Агент формирует подсказки и прогресс. Тьютор может принимать и отклонять выводы агента.

6-7 неделя

Рабочая версия MVP со всем функционалом. Собраны метрики. Анализ обратной связи и формирование требований для будущих доработок и расширения функционала.

Презентация для Заказчика.

8 неделя

Рабочая система готова к передаче Заказчику, документация.

- Кто вовлечён (роли)

Руководитель проекта, бизнес-системный аналитик, разработчики серверной части и пользовательских интерфейсов, специалист по исследованию данных, заказчик, включая специалистов и родителей.

- 1–2 ключевых риска и как их можно предусмотреть.

Безопасность данных при работе агента – предварительная выработка правил обработки информации и доступа к ним с юридическим отделом Заказчика, возможно локальное развертывание простой LLM для обезличивания данных для дальнейшего анализа внешней LLM.

Низкая / не своевременная заполняемость форм – контроль Заказчика, быстрый ввод данных через чек-листы, «умные» подстановки и значений по умолчанию, шаблоны или загрузку файлов с результатами, а также возможно формирование отчета для руководителя с отметками контроля заполнения обязательных данных на основе проведенных занятий.

4) Как вы будете выстраивать процесс работы с заказчиком и командой разработки:

- Кратко: формат, частота, фокус сообщения.

Ежедневные встречи: формат – 15 минут, фокус – что сделано вчера, что делаем сегодня, какие есть проблемы.

Еженедельные встречи: формат – 30-60 минут, фокус – демонстрация функционала, обратная связь, корректировка спринтов.

Общекорпоративные встречи с Заказчиком: формат – 30 минут (раз в две недели), фокус – обратная связь, ответы на вопросы, согласование / утверждение выполненных этапов.

Встречи с Заказчиком и стейкхолдерами: формат – 15-30 минут (по мере необходимости), фокус – методологические и организационные вопросы по проекту.

Инструментарий: таск-трекер (weeek или другой), база знаний (weeek, яндекс-wiki и т.д.), оперативная связь (мессенджер).

2. Мотивация участия в проекте:

- Почему тебе интересен этот проект?

Во-первых - меня всегда привлекало объединение образования и информационных технологий, а также оптимизация бизнес и производственных процессов. А текущий проект подкупает своей сложностью и неоднозначностью реализации на основе представленных бизнес-требований и тестовых заданий. Также он позволит закрепить на практике все этапы бизнес-анализа, включая этап системного анализа - проектирование ER- и C4-диаграмм.

Во-вторых - сравнить текущий подход с пилотным от выбора команды и организации взаимодействия до сдачи проекта.

- Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?

Совмещение ролей руководителя проекта и бизнес-системного аналитика.

- Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?

20 часов в неделю в течение 2 месяцев (возможно 3х месяцев), в вечернее время и выходные.
